


# 2012年 SOMESAT 線表の見直しについて

SOMESAT 事務局

hem

# 2010年頭に提示された線表

SOMESAT 想定スケジュール(全体) as of 2010/02/05 作成:超電磁(twitter: chodenzi)

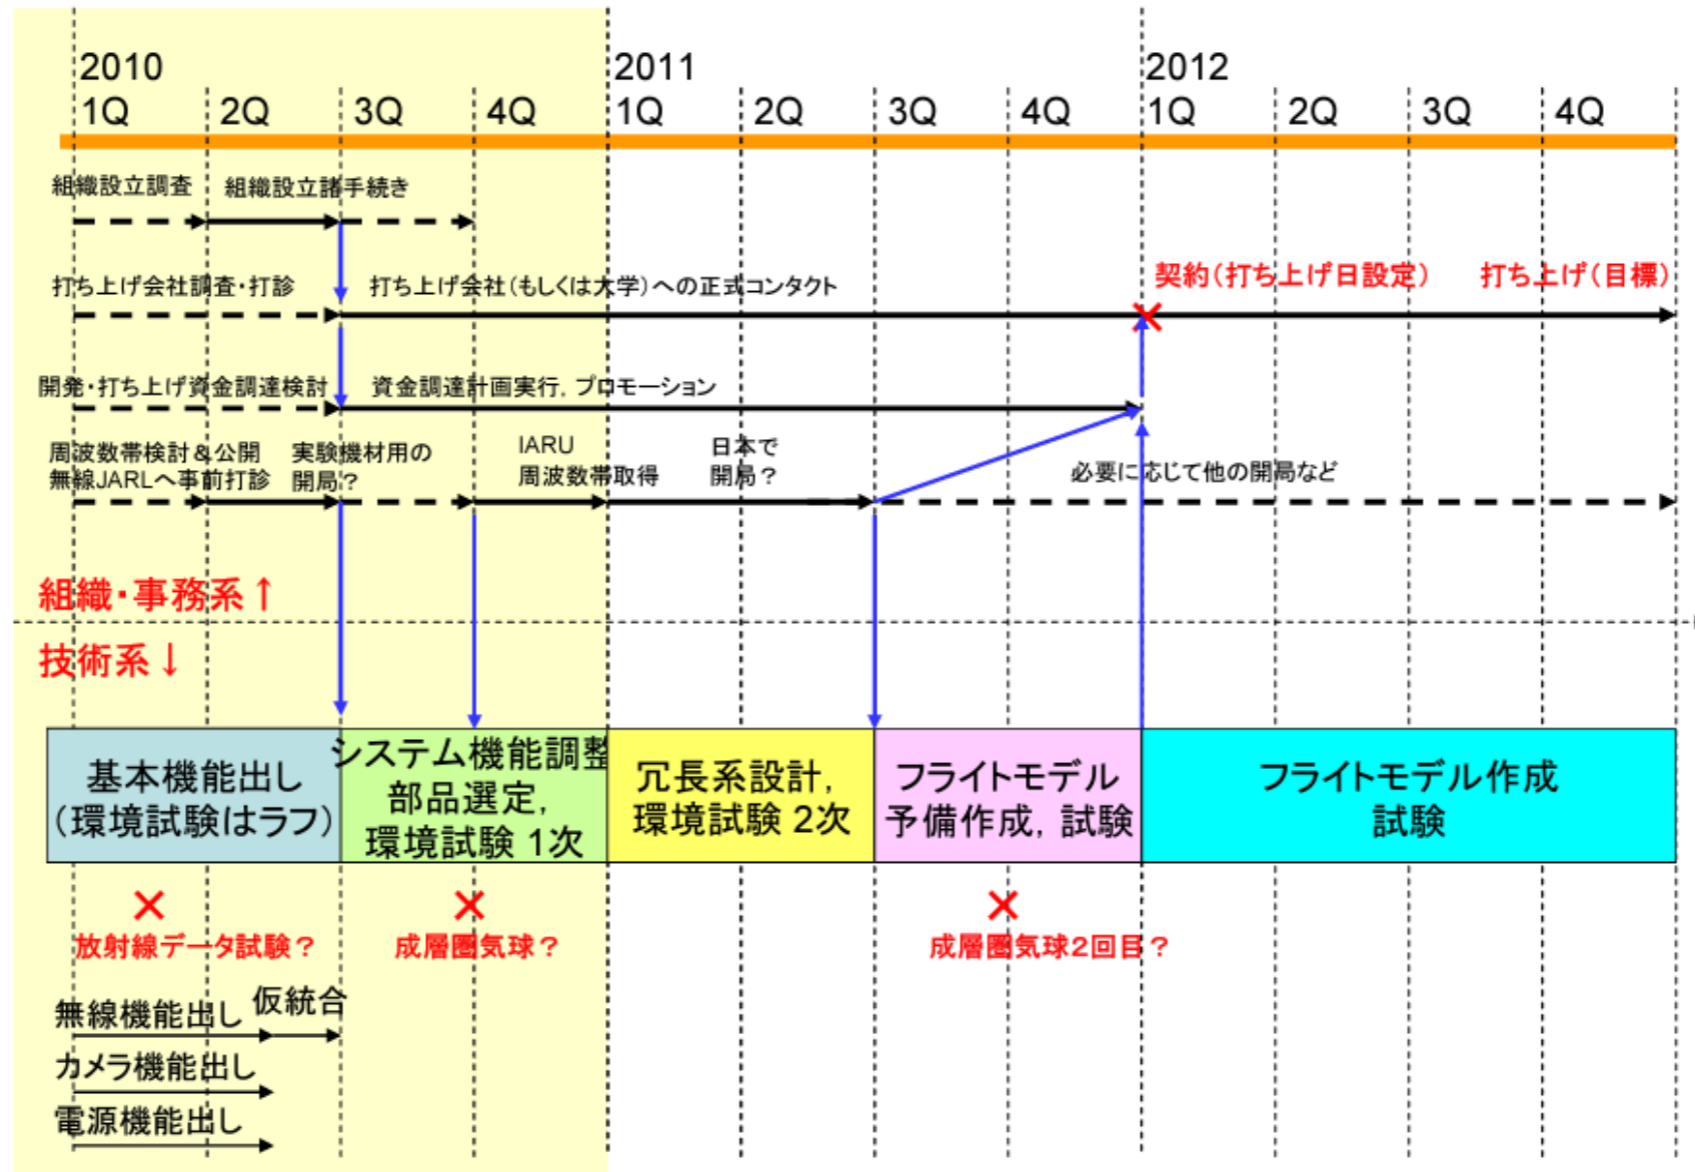

では、現状は？

# 現時点の状況

概ね2010線表でいうところの「2010年1Q」部分

- 組織設立:任意団体として設立。法人化は費用などから保留
- 打ち上げ会社調査:未着手
- 開発・打ち上げ資金調達検討:未着手
- 周波数帯域検討&公開:
- JARLへ事前打診:
- 技術系

# 何が原因？

- 具体的な目標が見えないので、手が出ないし呼び込めない
- イベント参加だけで消耗している
- 新イベント(ローバー開発)


# どう修正する？

- プロジェクトの意義、線表、課題について整理(優先)
- 現時点での見通しをいれる
- 未確定な部分を未確定として明らかにする


# 個人的2012年の目標

- プロジェクトのコンセプト、意義、線表、これまで蓄積してきた内容を整理する(過年度分があまりに溜まっている)
- 法人化について、現状に適した形での設立準備
- (アマチュア無線社団局設立について調査)

# 2012/1/28現在の法務班線表

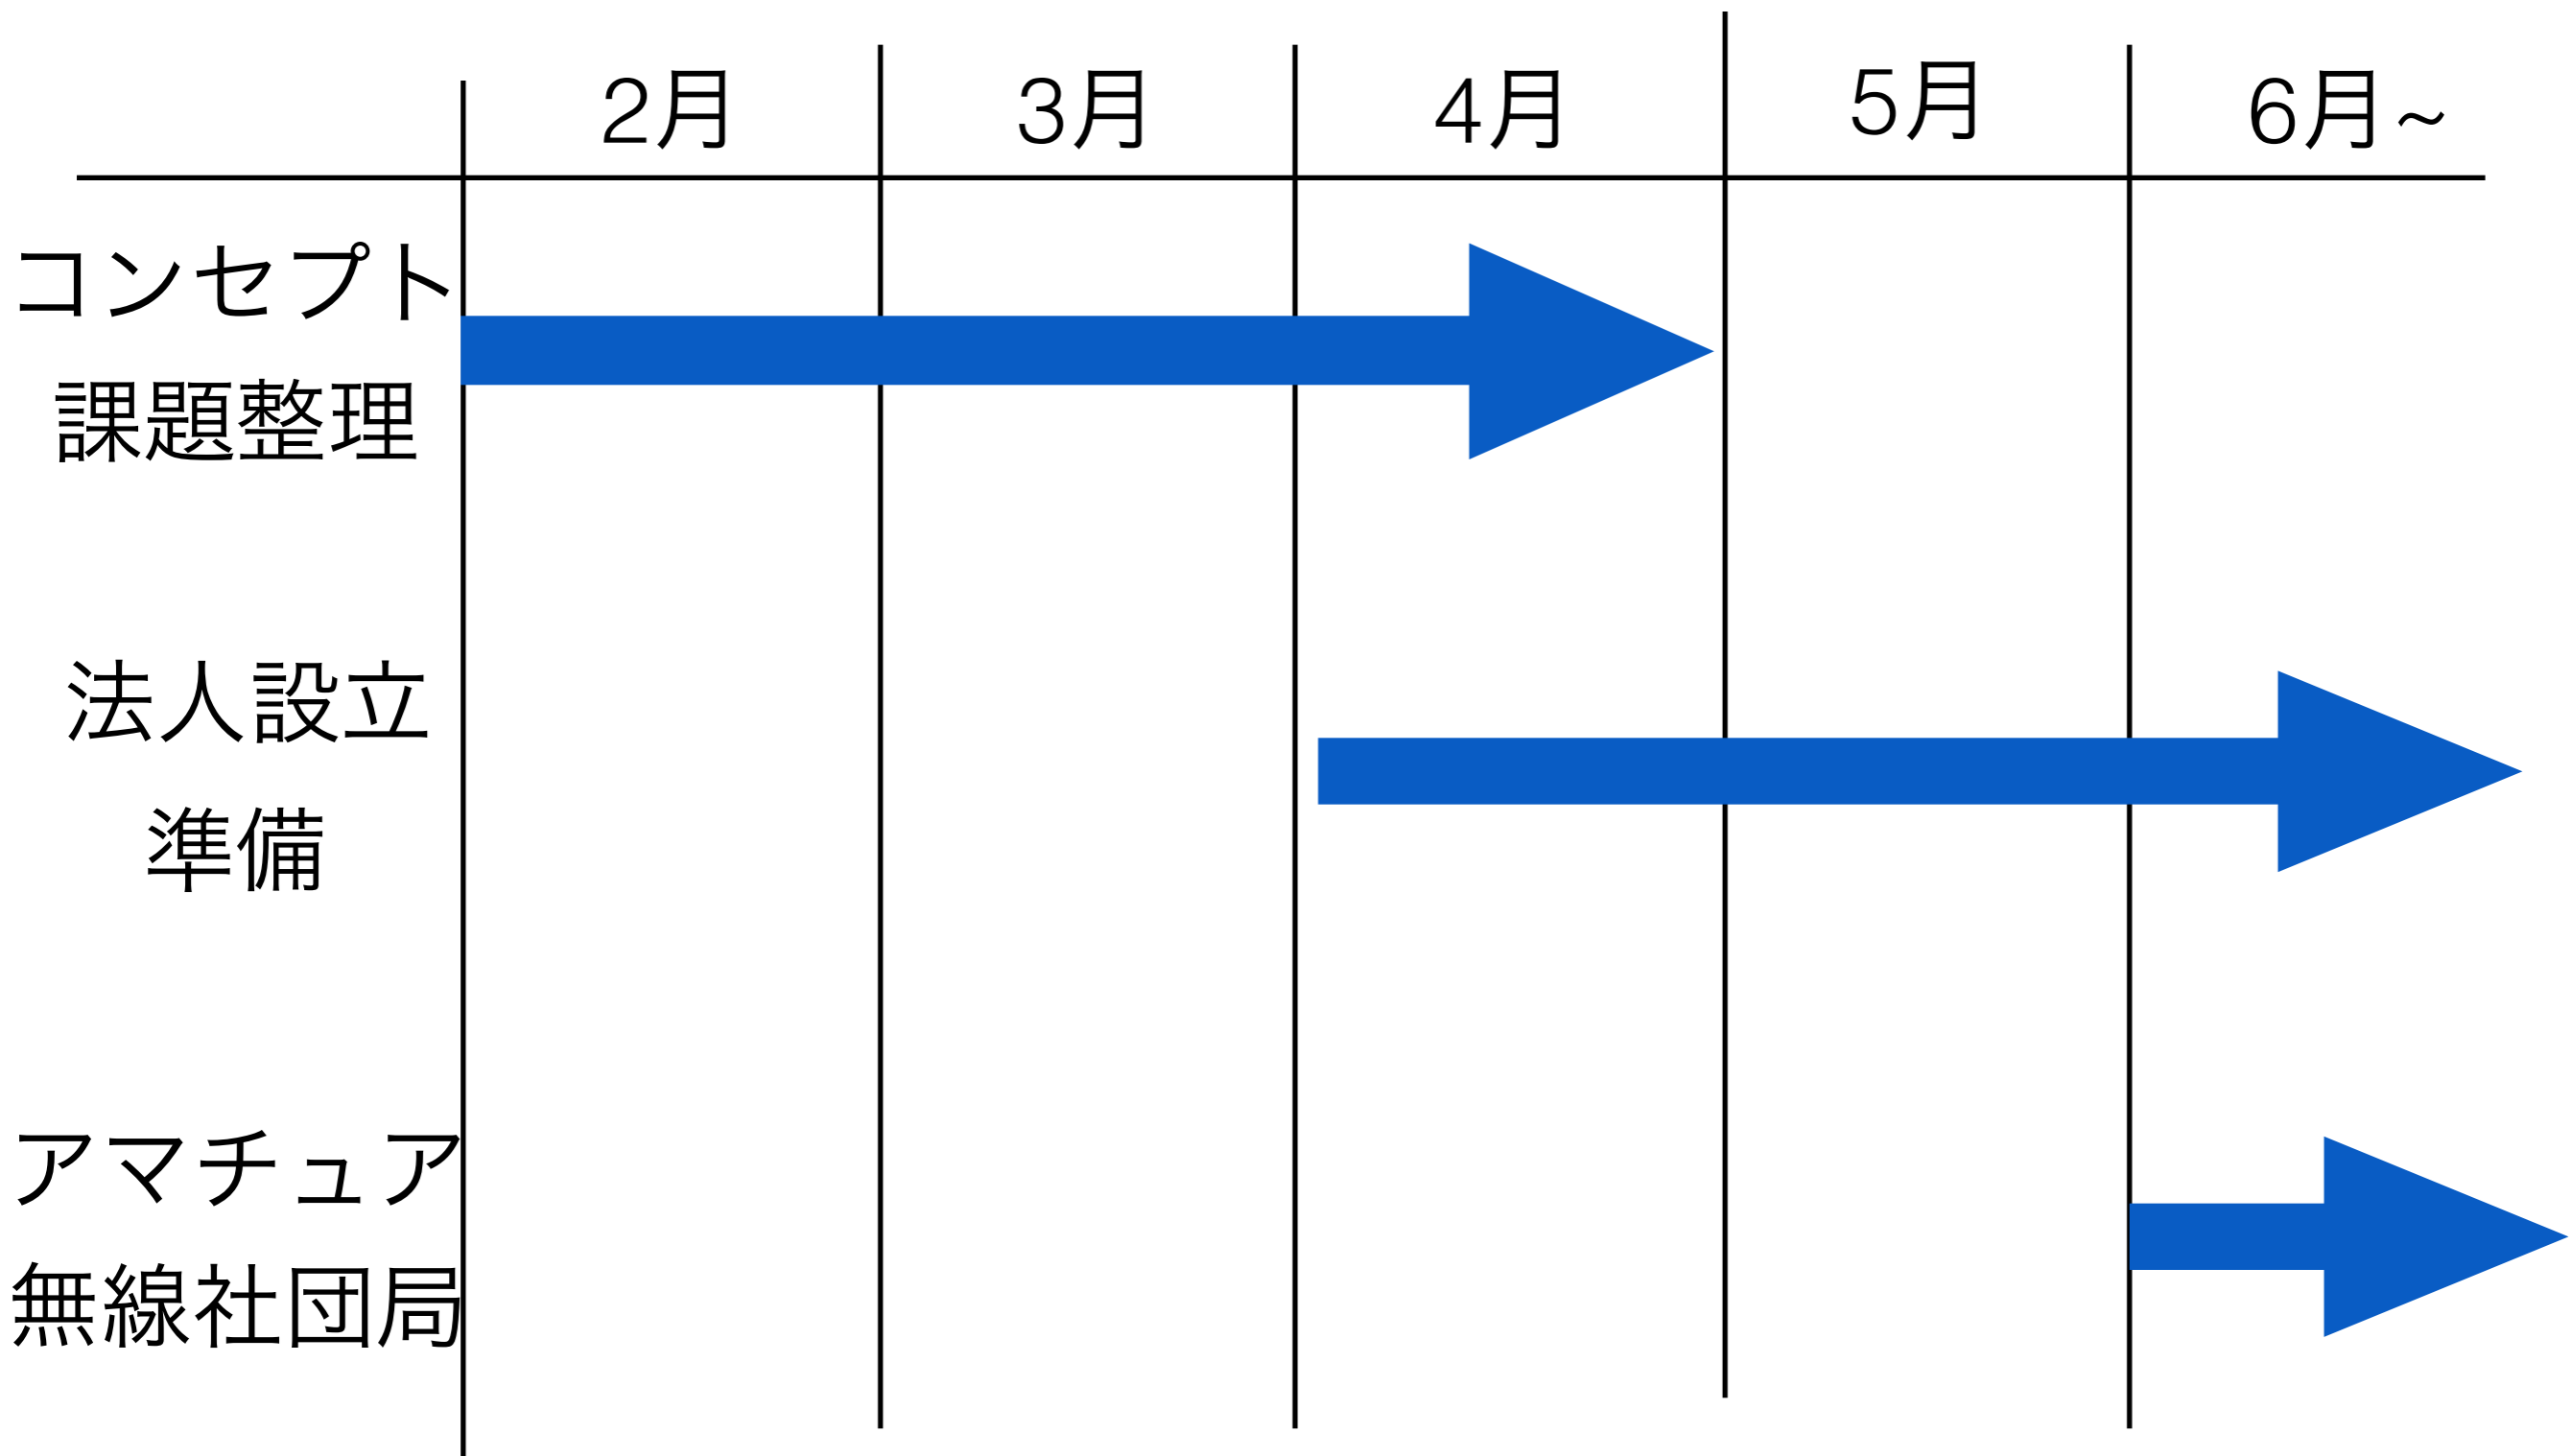

# 2012/1/24現在の法務線表(中期)

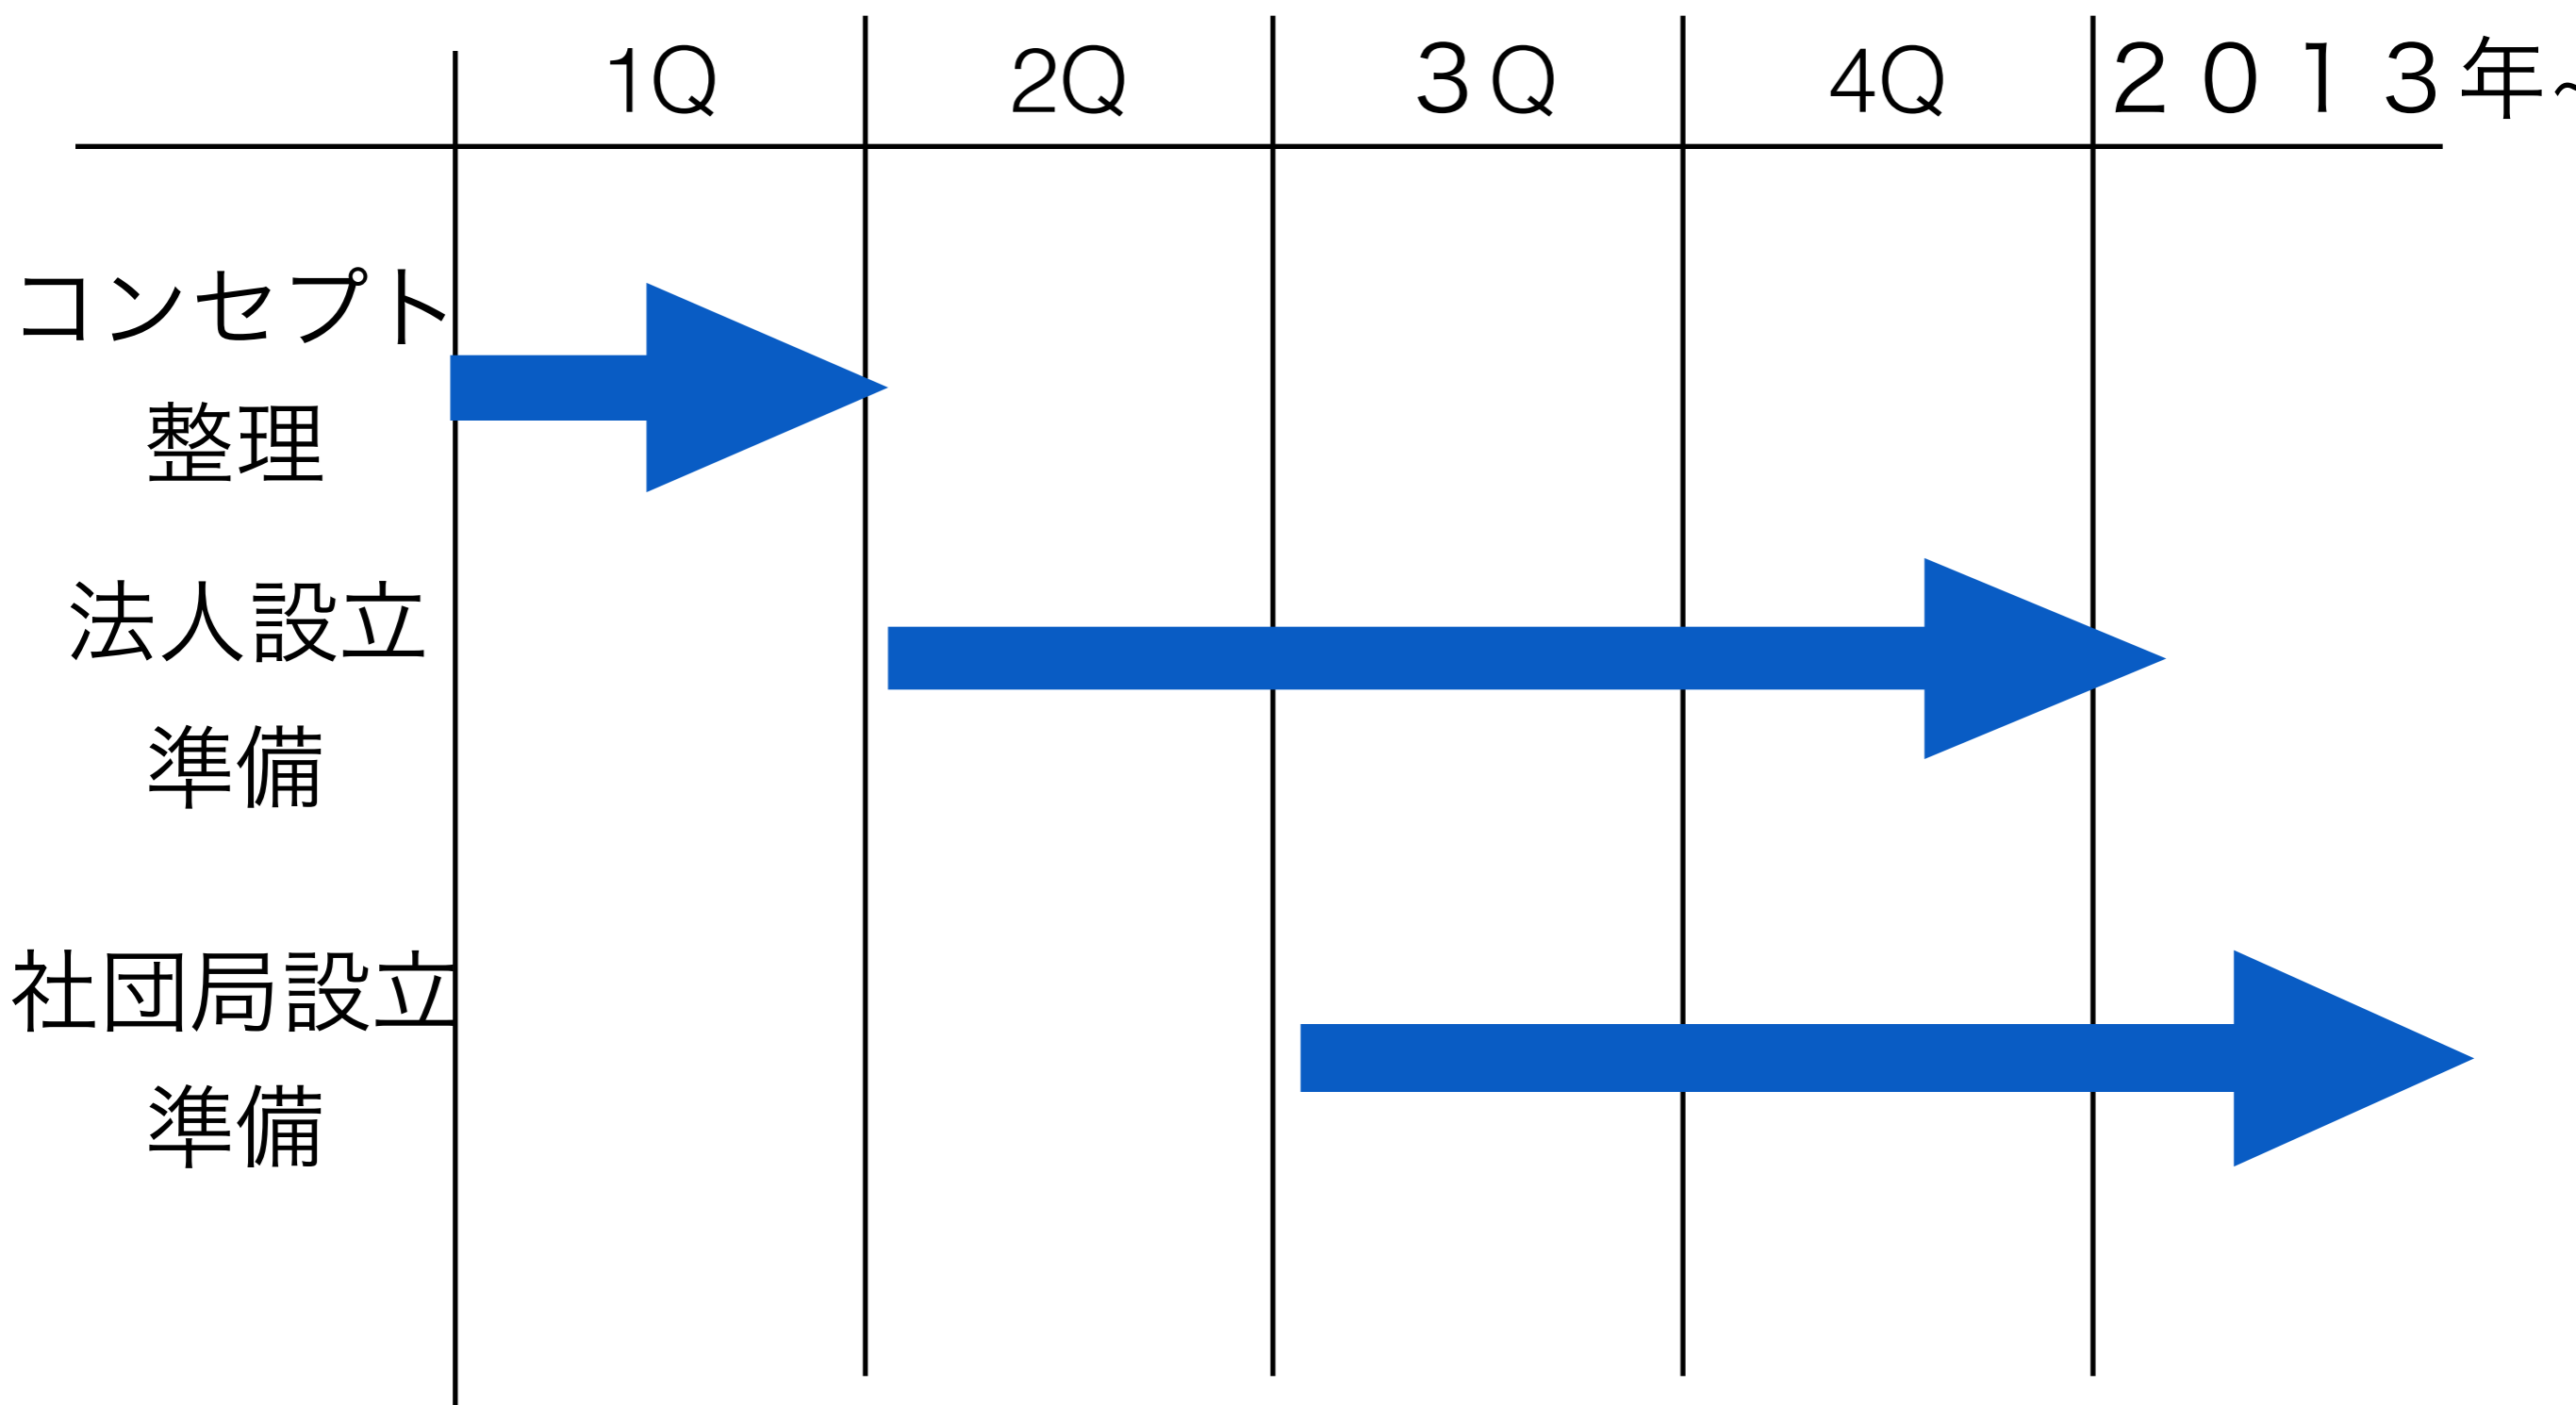



ありがとうございました
